


Итоговый отчет о реализации инвестиционных программ участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ (апрель 2020 г.)

Тепловые генерирующие компании (ОГК/ТГК) и компания, осуществляющая деятельность по экспорту/импорту энергии, заключили Агентские договоры (далее – АД) с целью поставки мощности по договорам о предоставлении мощности (далее – ДПМ). Всего было заключено 34 Агентских договора, из которых: 23 договора, обеспечивающих реализацию инвестиционных программ ОГК/ТГК (с контролем строительства), и 11 договоров, обеспечивающих заключение и исполнение ДПМ введенных в эксплуатацию генерирующих объектов (без контроля строительства). Данные договоры были заключены 01.11.2010 г. в соответствии с Правилами оптового рынка и условиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка в отношении объектов генерации, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 г. № 1334-р. В связи с реорганизацией Принципалов и изменением состава договоров к настоящему времени генерирующими компаниями заключено 44¹ Агентских договора. Общий объем генерирующих мощностей, в рамках реализации обязательств по заключенным ДПМ составил 29 876,75 МВт, по 136 объектам генерации (подробнее см. рис.1).

Рис. 1 «График вводов мощности с учетом переносов сроков начала поставки мощности, МВт. 2007-2020 гг.»

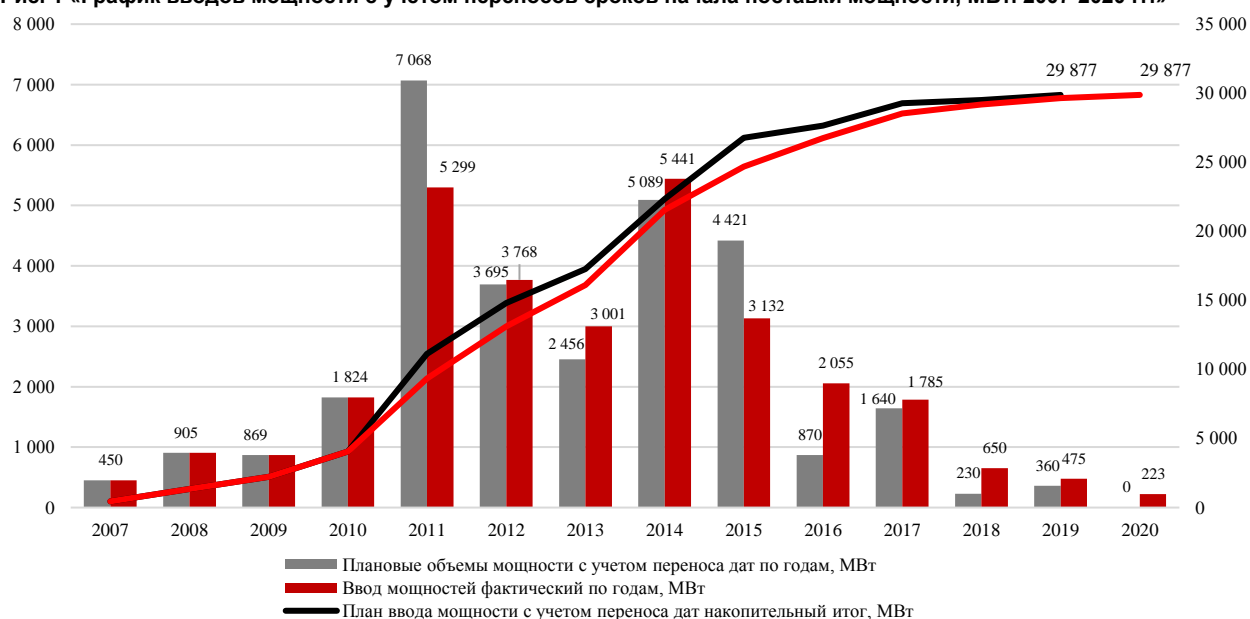

Источник: данные компаний

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ.

На февраль 2020 г. аттестован последний объект генерации в рамках реализации обязательств по заключенным ДПМ. Таким образом полностью завершена инвестиционная программа строительства генерирующих мощностей, предусмотренных ДПМ.

За период с 2010 по 2020 гг. по 69 объектам генерации общей установленной мощностью 17 554 МВт были нарушены сроки начала поставки мощности, что составляет 59% от установленной мощности введенных объектов. Задержка составила от 1 до 49 мес. (среднее 6 мес.).

¹ Без учета 2-х договоров, прекративших свое действие в связи с односторонним отказом от исполнения обязательств по ДПМ и переходом на КОМ.

ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ.


Всего с даты заключения договоров за несоблюдение сроков начала поставки мощности по ДПМ было оплачено штрафов на сумму 20 571,6 млн. руб. штрафов.

В соответствии с решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», расчет и списание сумм штрафов будут производиться до декабря 2023 года.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ ДПМ.

Среднее выполнение годовых планов финансирования, предусмотренных программой составило 72,3%. Максимальный объем годового финансирования наблюдался в 2013 году и составил 185,9 млрд. руб.

Рис.2 «Объем инвестиционных программ генерирующих компаний: соотношение плановых и фактических объемов финансирования, млрд. руб.»

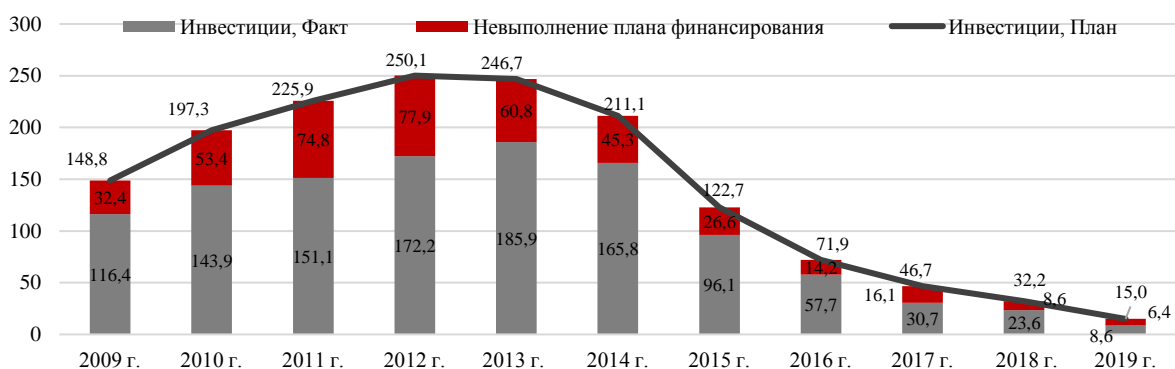

Источник: данные компаний

ВЫПОЛНЕНИЕ АО «ЦФР» ФУНКЦИЙ АГЕНТА.

АО «ЦФР» было получено и обработано более 11,6 тысяч отчетов Принципалов. Замечаний, которые по условиям договоров могли быть отнесены к штрафным – не выявлено.

В результате анализа полученной отчетности Принципалов было проконтролировано:

- целевое использование средств дополнительных эмиссий акций на сумму 122,8 млрд. руб.;
- возврат средств, отвлеченных на иные цели в размере 47,9 млрд. руб.

По 88 объектам генерации (64,7% от общего количества объектов генерации) были перенесены даты начала исполнения обязательств по поставке мощности по ДПМ. В результате участникам рынка направлено более 122 тыс. уведомлений.


По 18 объектам генерации (13,2% от общего количества объектов генерации) были получены уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке мощности по ДПМ с переходом на КОМ. В результате участникам рынка направлено более 13 тыс. уведомлений.

В рамках выполнения функции Агента вносились изменения в договоры (изменения состава договоров, изменения месторасположения и параметров объектов, изменения наименований

станций и др.). В результате изменений участникам рынка направлено более 16,9 тыс. уведомлений.

По состоянию на апрель 2020 г. поставляют мощность 105 объектов генерации общей установленной мощностью 25 132 МВт. Окончен период поставки мощности по 13 объектам генерации (9,6% от общего количества объектов генерации), общей установленной мощностью 2 104 МВт.

Рис.3 «Объем аттестованной мощности объектов генерации в рамках ДПМ на 1 января соответствующего года с учетом фактических вводов, отказов с переходом на КОМ и периода поставки мощности (2021-2028 гг. ожидаемое), МВт».

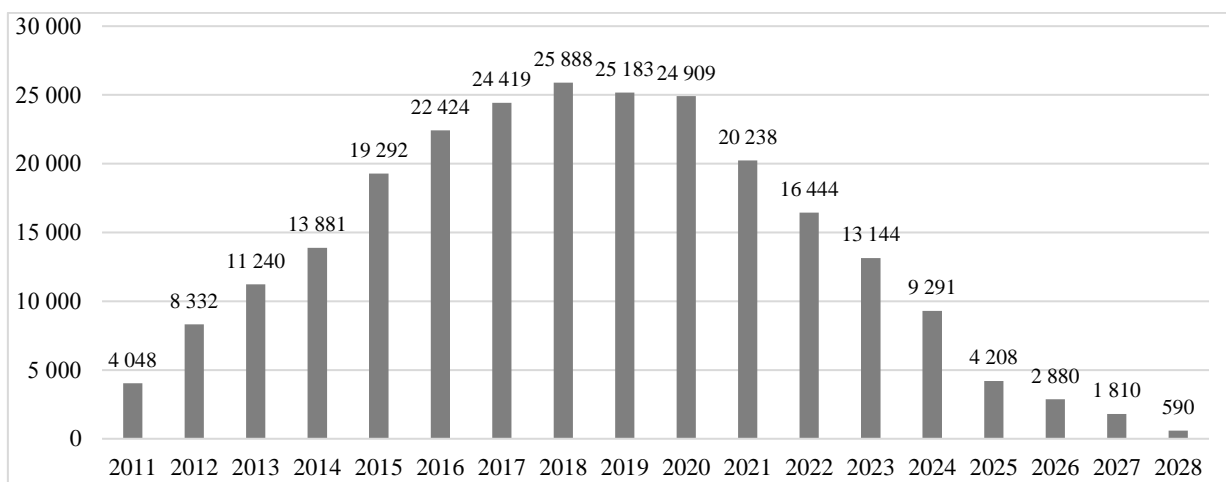

Источник: данные компаний
