

ОТЧЕТ

о ходе реализации отобранных инвестиционных проектов участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО (за 1 квартал 2022 года)

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Правила оптового рынка), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 Коммерческим оператором ежегодно начиная с 2013 г. проводятся конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ОПВ).


ОПВ проводится на 4 года вперед отдельно для каждого вида генерирующих объектов, функционирующих на основе использования разных видов возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ):

- фотоэлектрического преобразования энергии солнца (объект солнечной генерации);
- энергии ветра (объект ветровой генерации);
- энергии потоков воды (в том числе энергии сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электростанциях (генерирующий объект гидрогенерации).

Целевые показатели величин объемов ввода объектов ВИЭ и предельные величины капитальных затрат, используемые в целях проведения ОПВ, определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р.

По итогам ОПВ, проведенным в 2013-2021 гг., отобрано 311 объектов ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности в 2014-2028 гг., суммарный объем установленной мощности отобранных объектов составил 8 363 МВт. (подробнее см. рис.1).

Рис. 1 «Итоги ОПВ за 2013-2021 гг., МВт (количество объектов)»

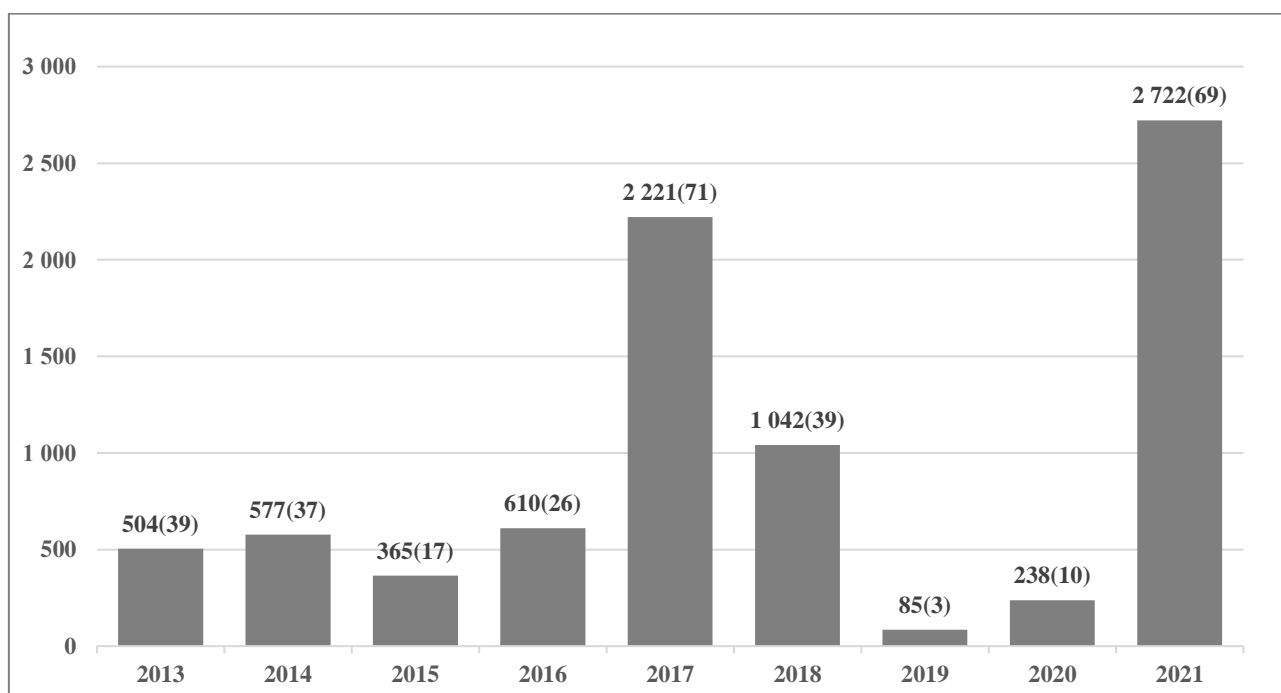

Среди отобранных объектов генерации:

- 160 объектов ветровой генерации общей установленной мощностью 5 420 МВт;
- 134 объектов солнечной генерации общей установленной мощностью 2 633 МВт;
- 17 объектов гидрогенерации общей установленной мощностью 310 МВт.


С учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, общее количество объектов, планируемых к вводу в 2014-2028 гг., уменьшилось с 311 до 302 единиц, общая установленная мощность снизилась с 8 363 МВт до 8 152 МВт.

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

На 2022 г. запланирован ввод 31 объекта генерации установленной мощностью 725,6 МВт.

В 1 квартале 2022 г. был запланирован ввод 1 объекта генерации установленной мощностью 25 МВт, который был введен в срок. Таким образом, план 1 квартала 2022г. выполнен на 100%. (подробнее см. рис.2).

Рис. 2 «Плановые и фактические показатели ввода мощности в 2014-2028 гг. с учетом ввода объектов генерации, запланированных к вводу в предыдущие годы, МВт»¹.

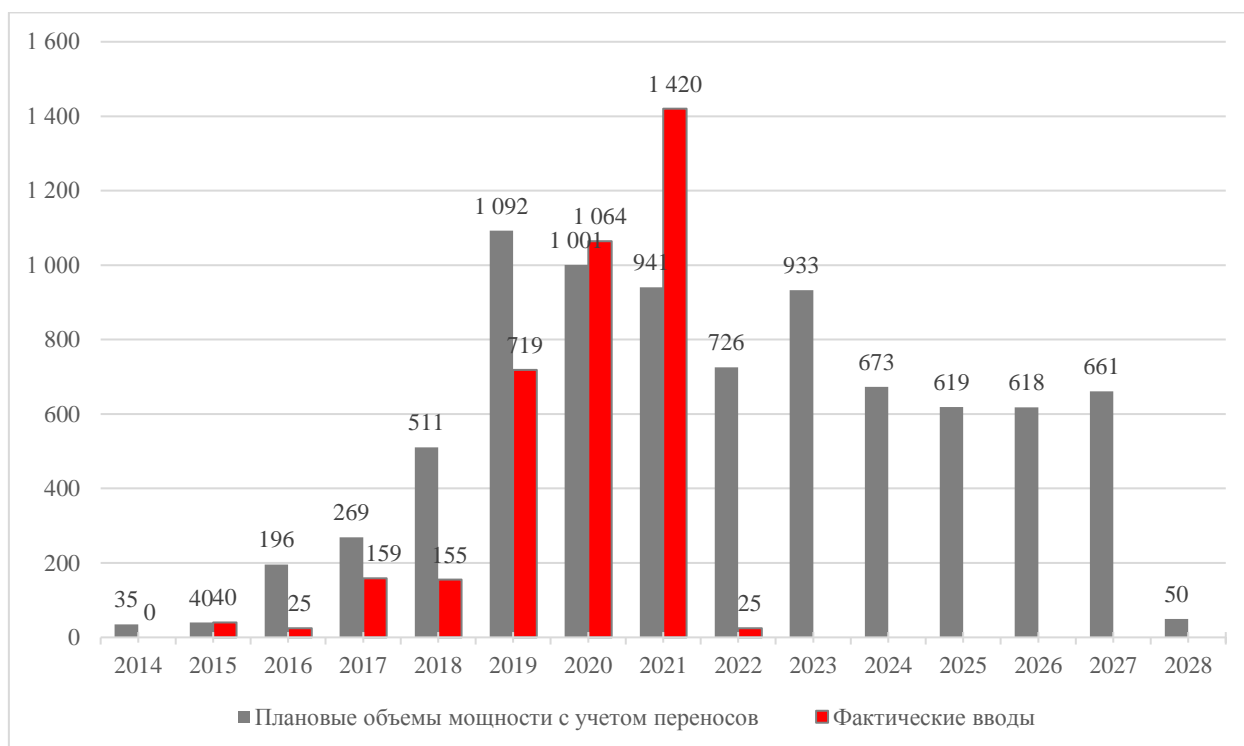

В период с 2014 г. по 1 квартал 2022 г. включительно введено 172 объекта генерации установленной мощностью 3 607,03 МВт, при плане ввода 178 объектов генерации (с учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ) установленной мощностью 3 898,7 МВт. Исполнение плана составляет 92,5%.

¹ В плановых показателях объема мощности на рис.2 не отражены изменения, связанные с прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ.

По состоянию на 01.04.2022г. даты начала поставки мощности нарушили 4 компании по 6 объектам генерации, общей мощностью 291,67 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 4 до 23 месяцев.

В 1 квартале 2022 года:

- были осуществлены функции по изменению местоположения 11 объектов генерации общей установленной мощностью 420,3 МВт по 2 компаниям;
- передача прав и обязанностей продавца по ДПМ ВИЭ новому продавцу осуществлена 1 компанией по 1 объекту генерации установленной мощностью 20 МВт;
- изменений дат начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ не осуществлялось.

III. ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

За нарушение сроков начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ в 2015 – 1 квартале 2022 гг. было рассчитано 10 485,4 млн. рублей и списано 10 282,6 млн. рублей штрафов (уровень оплаты – 98,1%). В 1 кв. 2022 г. было рассчитано 206,0 млн. рублей штрафов (что составляет 2,0% от общего объема рассчитанных штрафов) и списано 206,3 млн. рублей штрафов (что составляет 100,1% от рассчитанных в 1 квартале штрафов).

ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Особенности проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления (далее – ОПТБО), установлены Правилами оптового рынка.

По итогам ОПТБО, проведенного в 2017 г., отобрано 5 объектов ДПМ ТБО с плановой датой начала поставки в 2022 году, суммарный объем установленной мощности которых составляет 335 МВт.

В 1 квартале 2022 года ввода объектов ДПМ ТБО не осуществлялось.
